



Oggetto : videoispezione rete fognaria

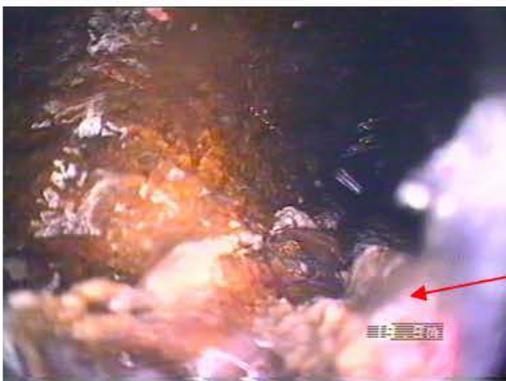

Esalatore ispezionato lato destro
(4° ispezione)

Abbiamo incontrato a circa mt
19.50 dal tetto e mt. 7.10 dalla
cantina due scarichi in plastica
che creano una ostruzione .

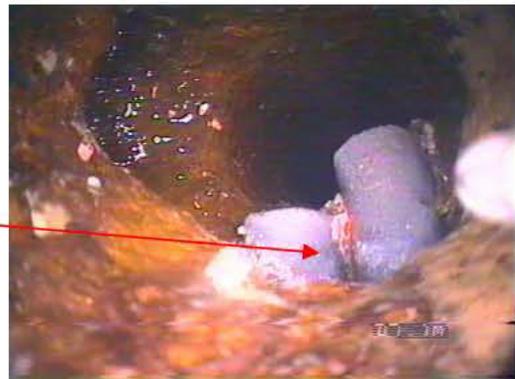

Vediamo sotto le tubazioni il
formarsi di calcare e carta che col
tempo possono causare
otturazione della colonna di
scarico.
